


Instalación Planta Solar Fotovoltaica Edificio JUNJI

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	INICIO PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA Proyecto Edificio JUNJI	0 días	lun 11-01-16	lun 11-01-16
2	Implementación Planta Solar Fotovoltaica	50 días	lun 11-01-16	lun 29-02-16
3	ACTIVIDADES	0 días	lun 18-01-16	lun 18-01-16
4	0.- Entrega Terreno	1 día	lun 25-01-16	lun 25-01-16
5	1.- Movilización RRHH, Materiales y Maquinaria	1 día	mar 26-01-16	mar 26-01-16
6	2.- Instalacion de Línea de Vida Provisoria	1 día	lun 25-01-16	lun 25-01-16
7	4.- Suministro y Acopio de Insumos en Obra	3 días	mié 27-01-16	vie 29-01-16
8	5.- Preparación Obra / Limpieza	3 días	sáb 30-01-16	lun 01-02-16
9	6.- Replanteo Sistema de Montaje Sobre Cubierta	2 días	mar 26-01-16	mié 27-01-16
10	7.- Implantación Sistema de Montaje	7 días	jue 28-01-16	mié 03-02-16
11	8.- Instalacion Piso Tecnico Proyecto	3 días	jue 28-01-16	sáb 30-01-16
12	9.- Instalación Paneles e Inversores	6 días	jue 28-01-16	mar 02-02-16
13	10.- Instalación Partidas Eléctricas CC	5 días	mar 02-02-16	sáb 06-02-16
14	11.- Instalación Partidas Eléctricas CA	4 días	mar 02-02-16	vie 05-02-16
15	12.- Corte para Conectar Planta FV	1 día	mar 09-02-16	mar 09-02-16
16	13.- Puesta en Marcha Instalación	2 días	mié 10-02-16	jue 11-02-16
17	14.- Chequeo de la Instalación Junto con Cliente	1 día	vie 12-02-16	vie 12-02-16
18	15.- Recepción Planta Fotovoltaica	1 día	lun 15-02-16	lun 15-02-16
19	FIN DEL PROYECTO	1 día	lun 15-02-16	lun 15-02-16
20	DURACIÓN TOTAL PROYECTO	21 días	mar 26-01-16	lun 15-02-16

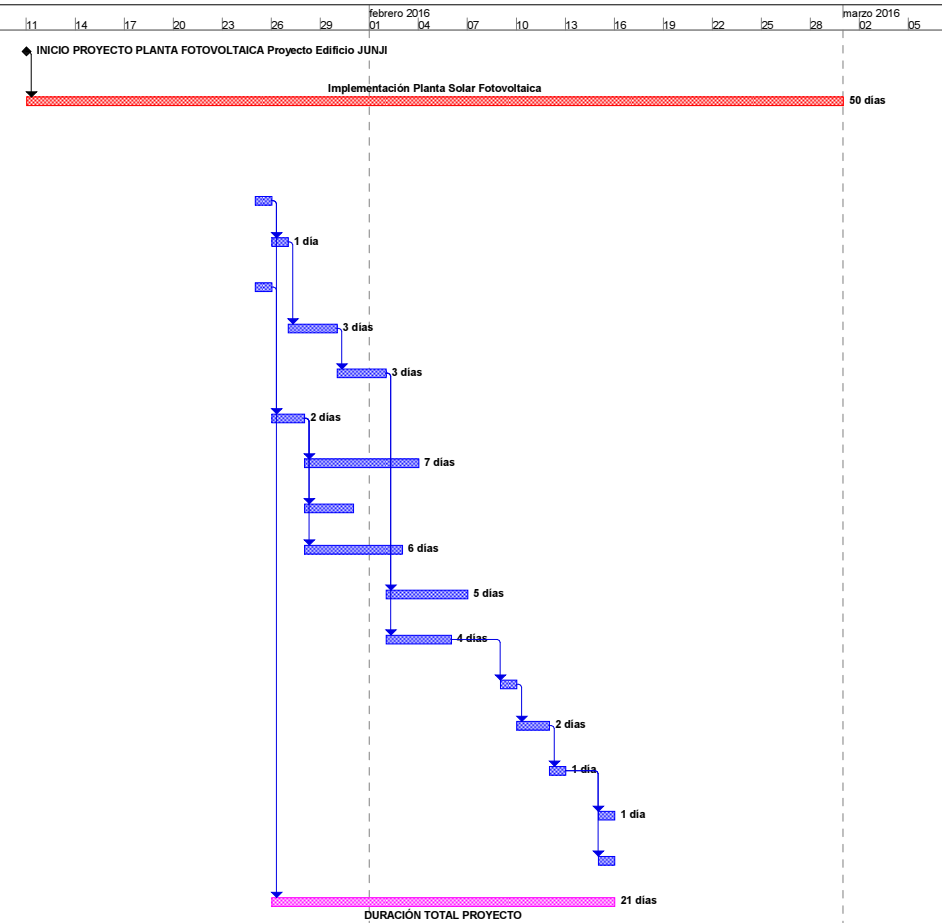

Proyecto: Techos Solares Teleton Fecha: 27 de Julio del 2015	Tarea resumida	División	Agrupar por síntesis	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas
Hito resumido	Tareas externas	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso
Progreso resumido	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Progreso	
