Instalación Planta Solar Fotovoltaica
Edificio Regimiento

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**INICIO PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA Proyecto Edificio Regimiento**	0 días	lun 11-01-16	lun 11-01-16
2	**Implementación Planta Solar Fotovoltaica**	50 días	lun 11-01-16	lun 29-02-16
3	**ACTIVIDADES**	0 días	lun 11-01-16	lun 11-01-16
4	0.- Entrega Terreno	1 día	lun 25-01-16	lun 25-01-16
5	1.- Movilización RRHH, Materiales y Maquinaría	3 días	mar 26-01-16	jue 28-01-16
6	2.- Instalacion de Linea de Vida Provisoria	1 día	lun 25-01-16	lun 25-01-16
7	4.- Suministro y Acopio de Insumos en Obra	3 días	vie 29-01-16	dom 31-01-16
8	5.- Preparación Obra / Limpieza	3 días	lun 01-02-16	mié 03-02-16
9	6.- Replanteo Sistema de Montaje Sobre Cubierta	4 días	mar 26-01-16	vie 29-01-16
10	7.- Implantación Sistema de Montaje	8 días	mar 02-02-16	mar 09-02-16
11	8.- Instalacion Piso Tecnico Proyecto	8 días	sáb 30-01-16	sáb 06-02-16
12	9.- Instalación Paneles e Inversores	8 días	sáb 30-01-16	sáb 06-02-16
13	10.- Instalación Partidas Eléctricas CC	8 días	jue 04-02-16	jue 11-02-16
14	11.- Instalación Partidas Eléctricas CA	4 días	jue 04-02-16	dom 07-02-16
15	12.- Corte para Conectar Planta FV	1 día	jue 11-02-16	jue 11-02-16
16	13.- Puesta en Marcha Instalación	2 días	vie 12-02-16	sáb 13-02-16
17	14.- Chequeo de la Instalación Junto con Cliente	1 día	lun 15-02-16	lun 15-02-16
18	15.- Recepción Planta Fotovoltaica	1 día	jue 18-02-16	jue 18-02-16
19	**FIN DEL PROYECTO**	**1 día**	**jue 18-02-16**	**jue 18-02-16**
20	**DURACIÓN TOTAL PROYECTO**	**24 días**	**mar 26-01-16**	**jue 18-02-16**

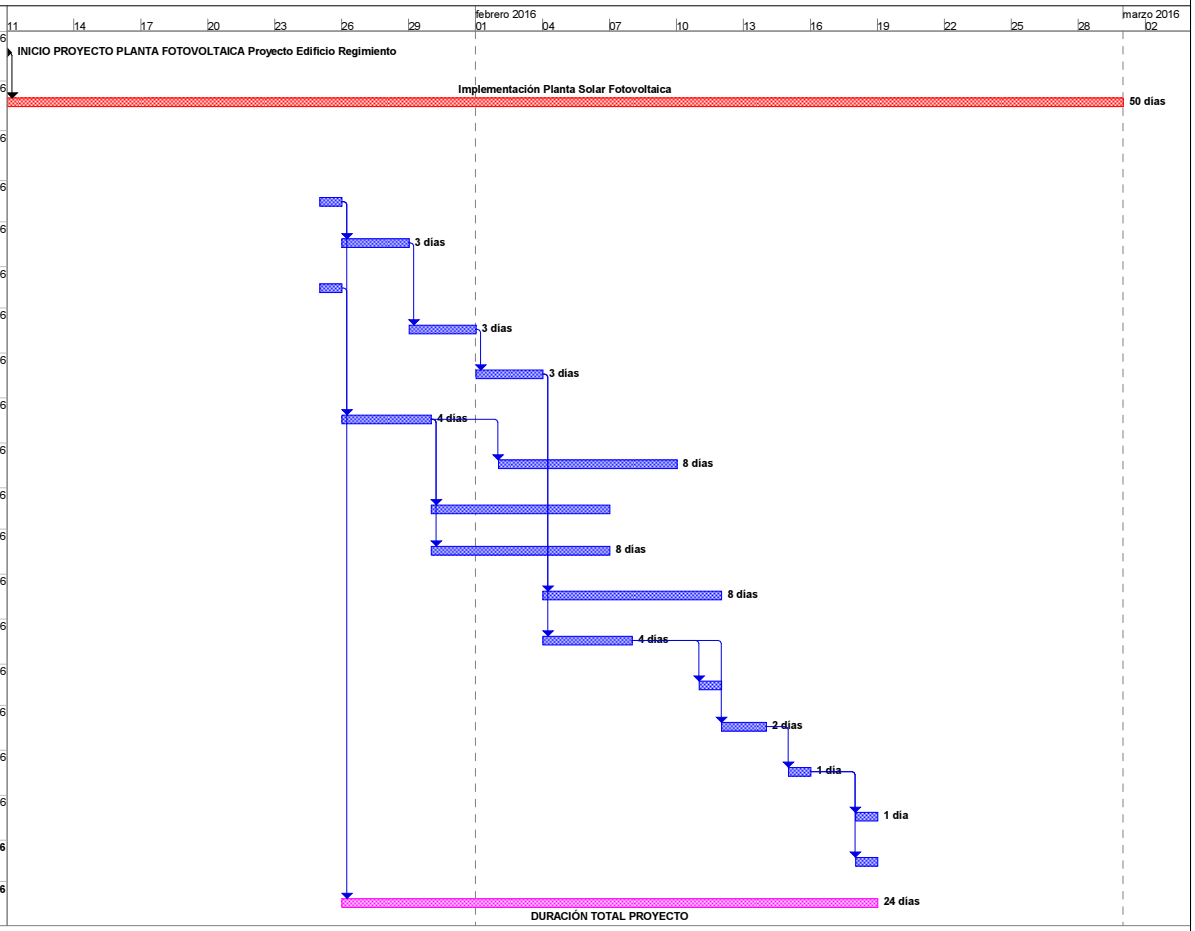

Proyecto: Techos Solares Teleton
Fecha: 27 de Julio del 2015

Tarea		Tarea resumida		División		Agrupar por síntesis		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas			
Hito		Hito resumido		Tareas externas		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo			
Resumen		Progreso resumido		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Progreso			

TRITEC-Intervento SpA
Doctor Manuel Barros Borgoño 71 Oficina 1604, Providencia, Santiago, Departamento de Operaciones
www.tritec-intervento.cl
