Id	Nombre de tarea
1	Adjudicación
2	**Fase administrativa**
9	Plazo máximo para entrega de contrato firmado
10	FIN de Fase Administrativa
11	Envío desde Amberg
12	Transporte Container Amberg de Valpo a Stgo
13	Pedido Alusin (H&M)
14	Transporte estructura Alusín de Valp. a Stgo.
15	
16	**Licitación Hospital & Museo**
17	**Fase de Planificación e Instalación - Hospital &**
18	**Fase de Planificación - Hospital & Museo**
19	Elaboración y entrega de Ingeniería
20	Revisión y aprobación Ingeniería
21	Subsanación de las observaciones de la
22	5 días
23	**Fase de Obras - Hospital & Museo**
24	**Fase de Obras - Museo**
25	Fase pasillo técnico + Seguridad
26	Fase instalación CC
27	Instalación AC Subcontrato
28	**Fase de Obras - Hospital**
29	Fase pasillo técnico + Seguridad
30	Fase instalación CC
31	Instalación AC Subcontrato
32	**Fase de entrega de Documentos del numeral 5 de las Bases Técnicas - Hospital & Museo**
34	**Fase de desarrollo actividades del numeral 6 de las bases técnicas - Hospital & Museo**
36	Entrega Ing. de Detalle
37	Revisión de Ing. de Detalle
38	Subsanación de Ing. de Detalle
39	Plazo máx para Planificación (Ingeniería de Detalle
40	Plazo max. Para obra -TE4 declarado - Hospital &
41	Plazo max. Para entrega Documentos - H&M
42	Plazo max. Para desarrollo de actividades - H&M
43	Entrega de Garantía de Operación
44	Entrega de Garantía de Riesgo
45	Entrega del seguro de responsabilidad civil

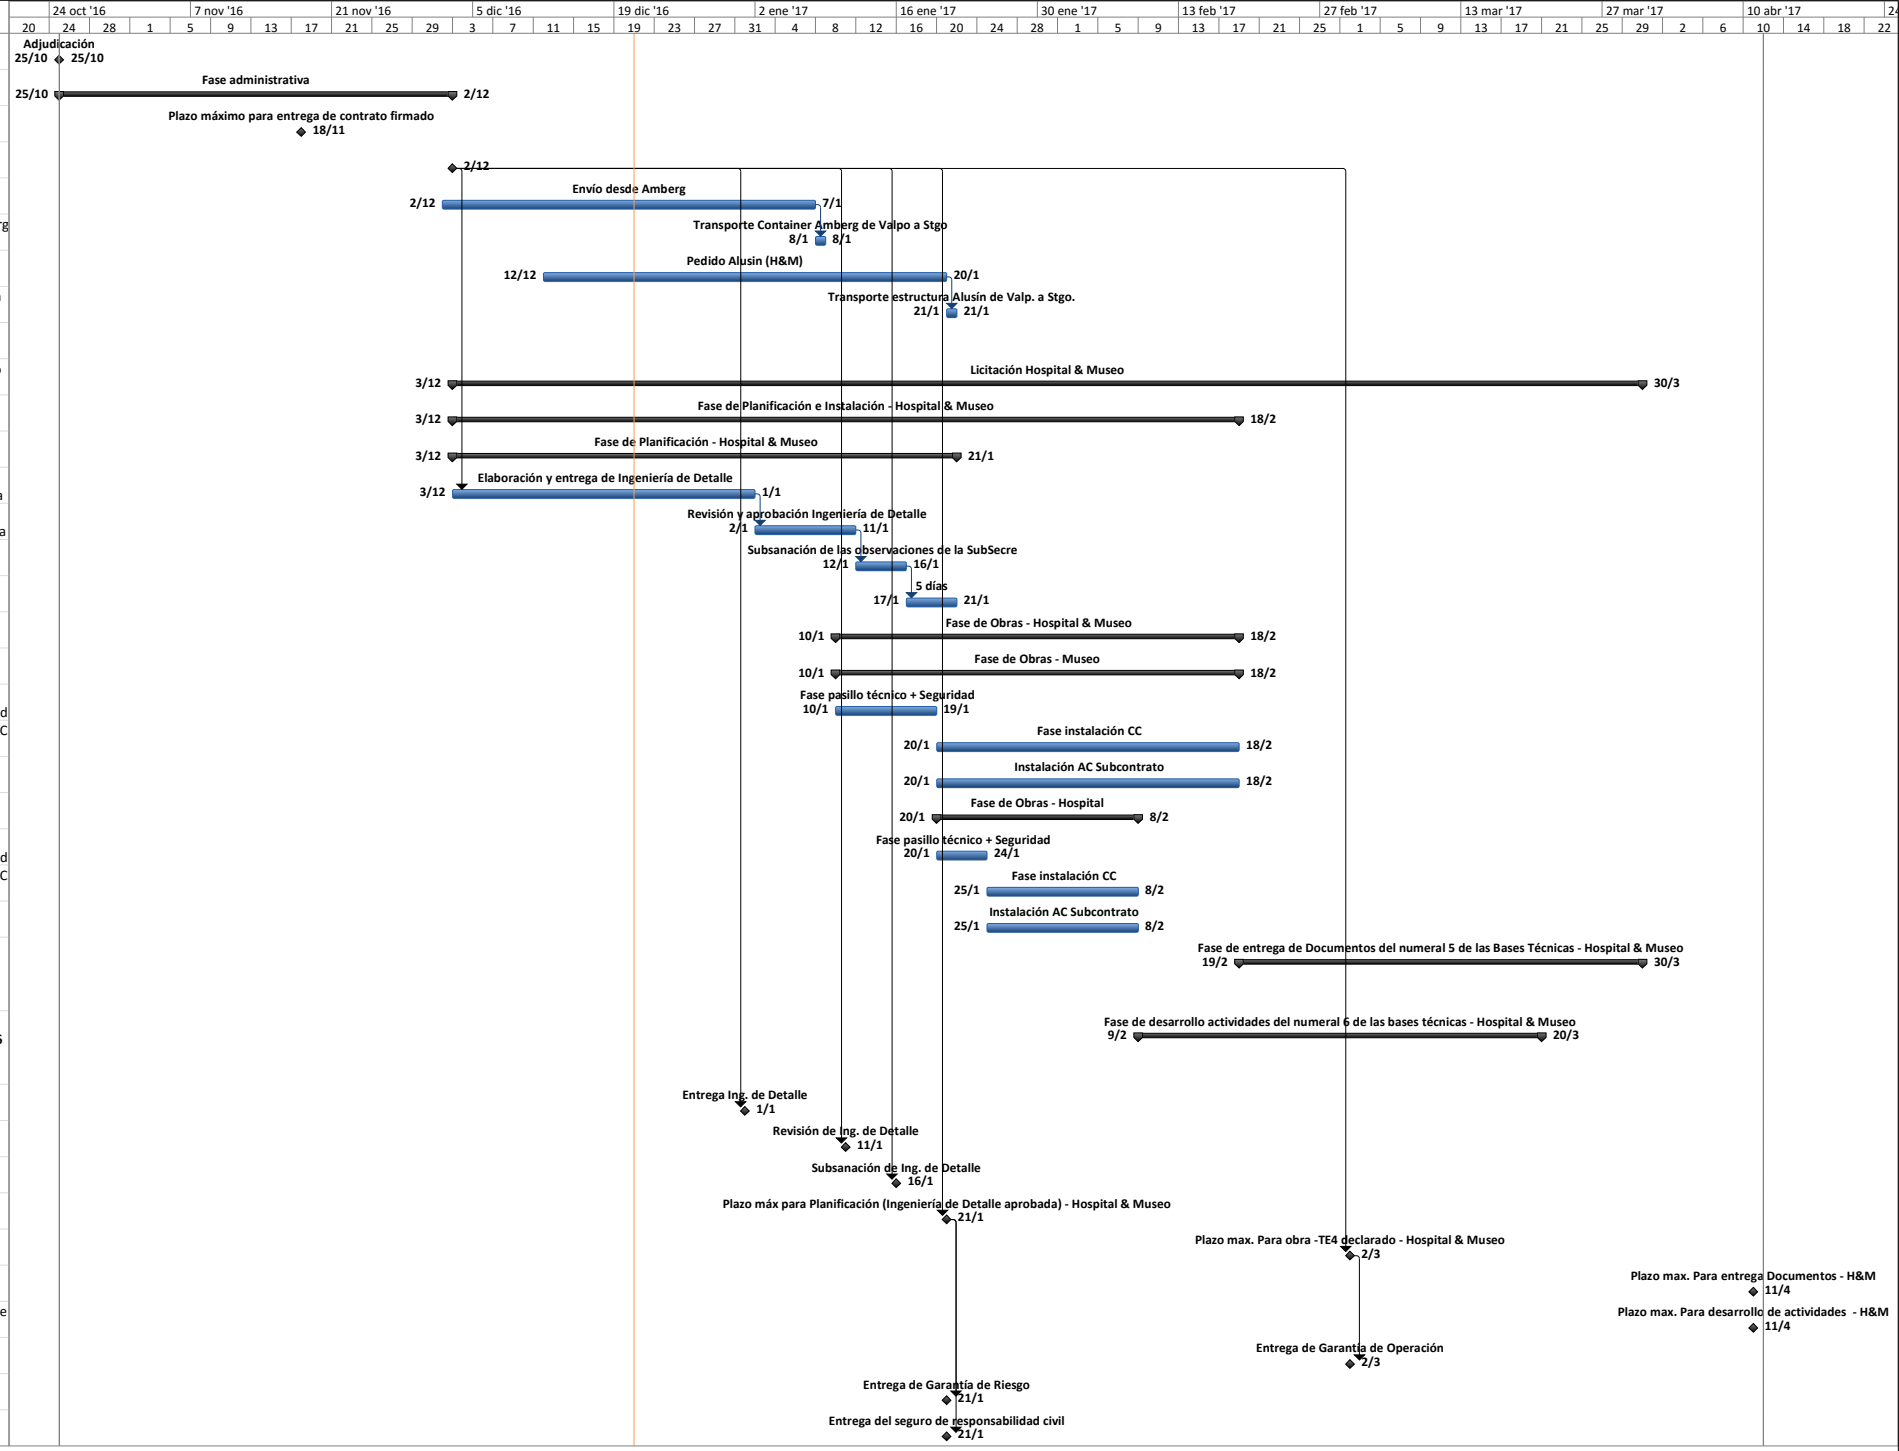

Proyecto: Carta Gantt - Hospital +
Fecha: mié 21/12/16

Tarea		Resumen		Hito externo		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		Sólo fin	
División		Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Tareas externas		Hito inactivo		Sólo duración		Sólo el comienzo		Progreso	
