Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**LICEO ALFREDO NAZAR - VALPARAISO (70 Kw)**	**180 días**	**lun 06/11/17**	**vie 04/05/18**
2	INGENIERÍA DE DETALLE	30 días	lun 06/11/17	mar 05/12/17
3	INSTALACIÓN - TE4	90 días	mié 06/12/17	lun 05/03/18
4	INGRESO F6	60 días	mar 06/03/18	vie 04/05/18
5	**INSTALACIÓN 70 kW**	**141 días?**	**vie 15/12/17**	**vie 04/05/18**
6	Entrada Terreno	0 días	vie 15/12/17	vie 15/12/17
7	Montaje P. Técnico y Gateras	13 días	vie 15/12/17	mié 27/12/17
8	Montaje Estructuras	13 días	jue 28/12/17	mar 09/01/18
9	Montaje Módulos	13 días	mié 10/01/18	lun 22/01/18
10	Canalización y Cableado CC	10 días	mar 23/01/18	jue 01/02/18
11	Canalización y Cableado AC	7 días	vie 02/02/18	jue 08/02/18
12	Instalación Inversores	7 días	vie 09/02/18	jue 15/02/18
13	Instalación Tablero FV	7 días	vie 16/02/18	jue 22/02/18
14	Conexión TDA. Y Monitorización	11 días	vie 23/02/18	lun 05/03/18
15	Ingreso TE4	0 días	lun 05/03/18	lun 05/03/18
16	Conexión a Red y Entrega Doc.	60 días	mar 06/03/18	vie 04/05/18
17	Ingreso F6	0 días	vie 04/05/18	vie 04/05/18
18				

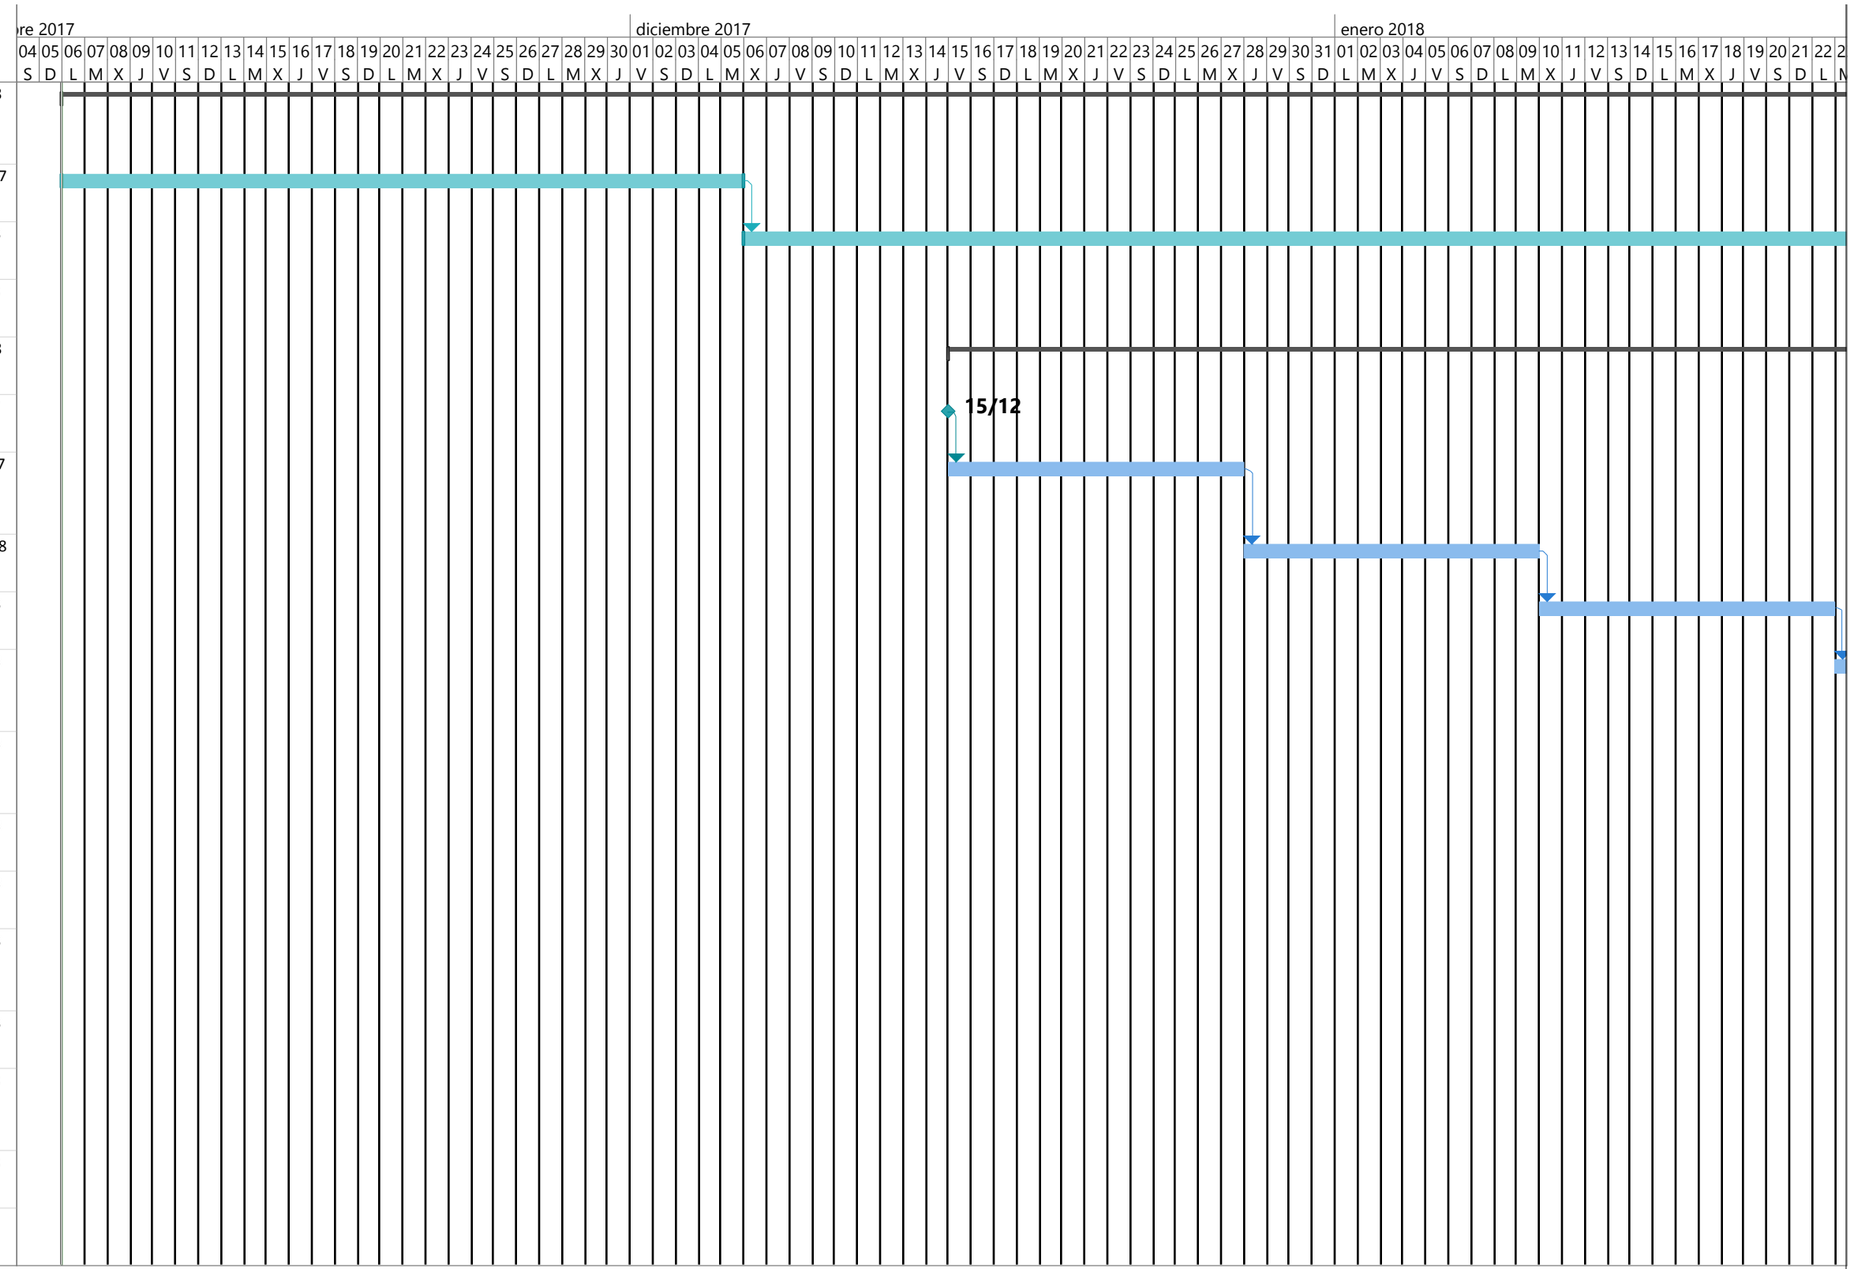

Proyecto: GANTT LICEO VALPO
Fecha: lun 06/11/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

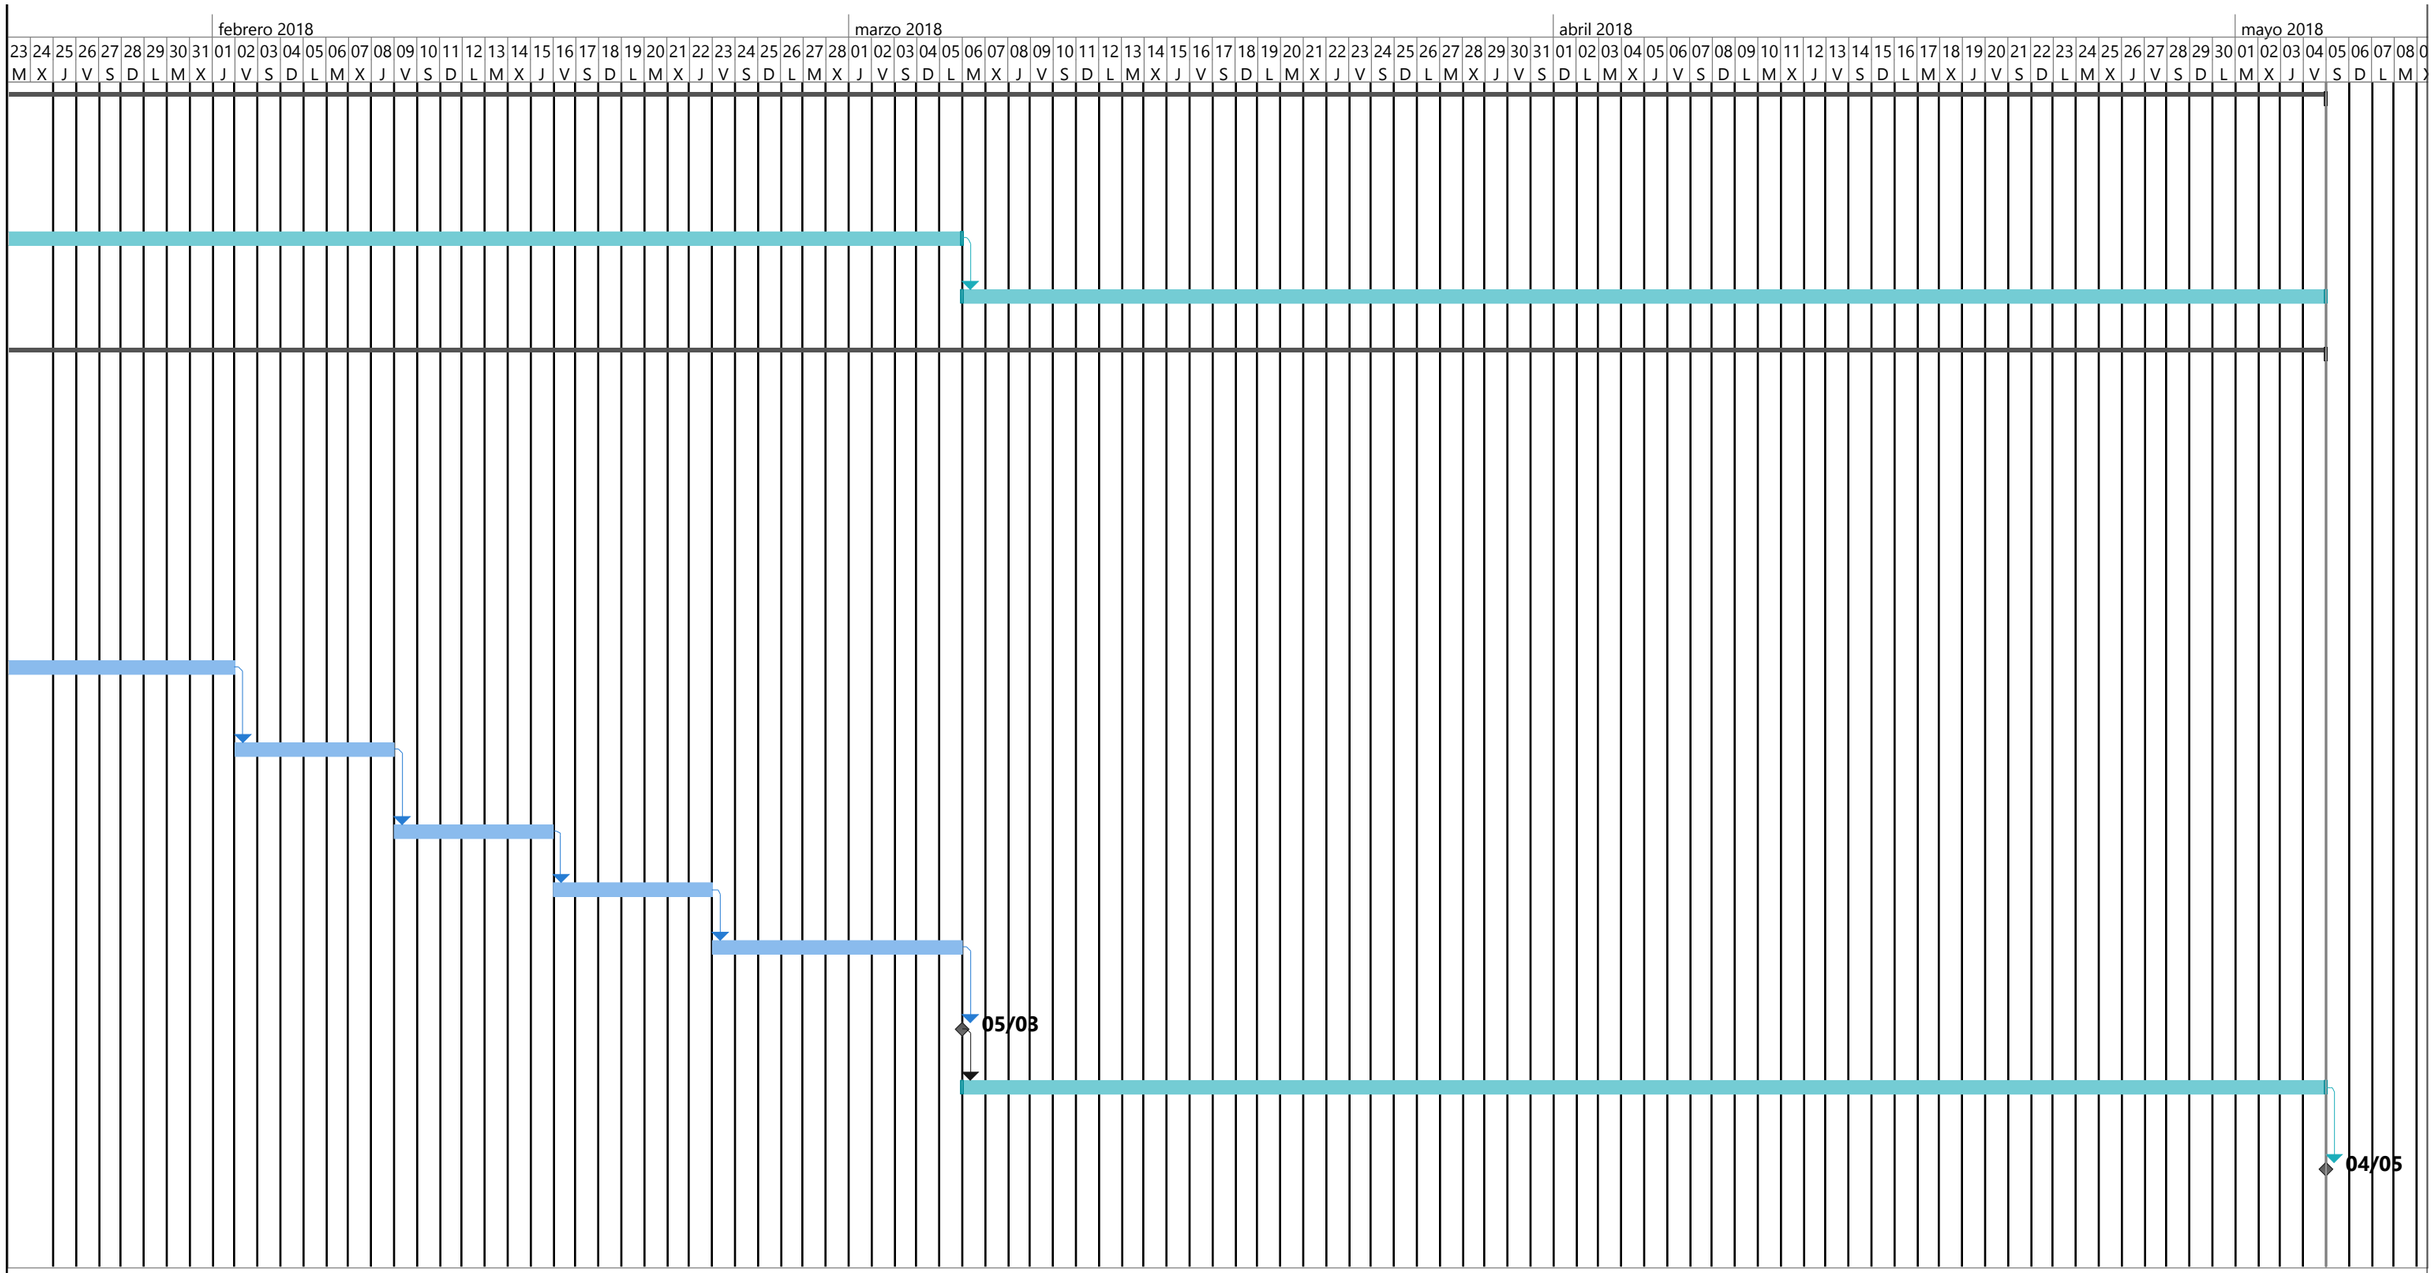

Proyecto: GANTT LICEO VALPO
Fecha: lun 06/11/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
